


ASKØ / LILLEØ – NU MED FIBERNET
FRA 4. DECEMBER 2014



På Forkant – Ikke Udkant

GOLDEN MOMENT

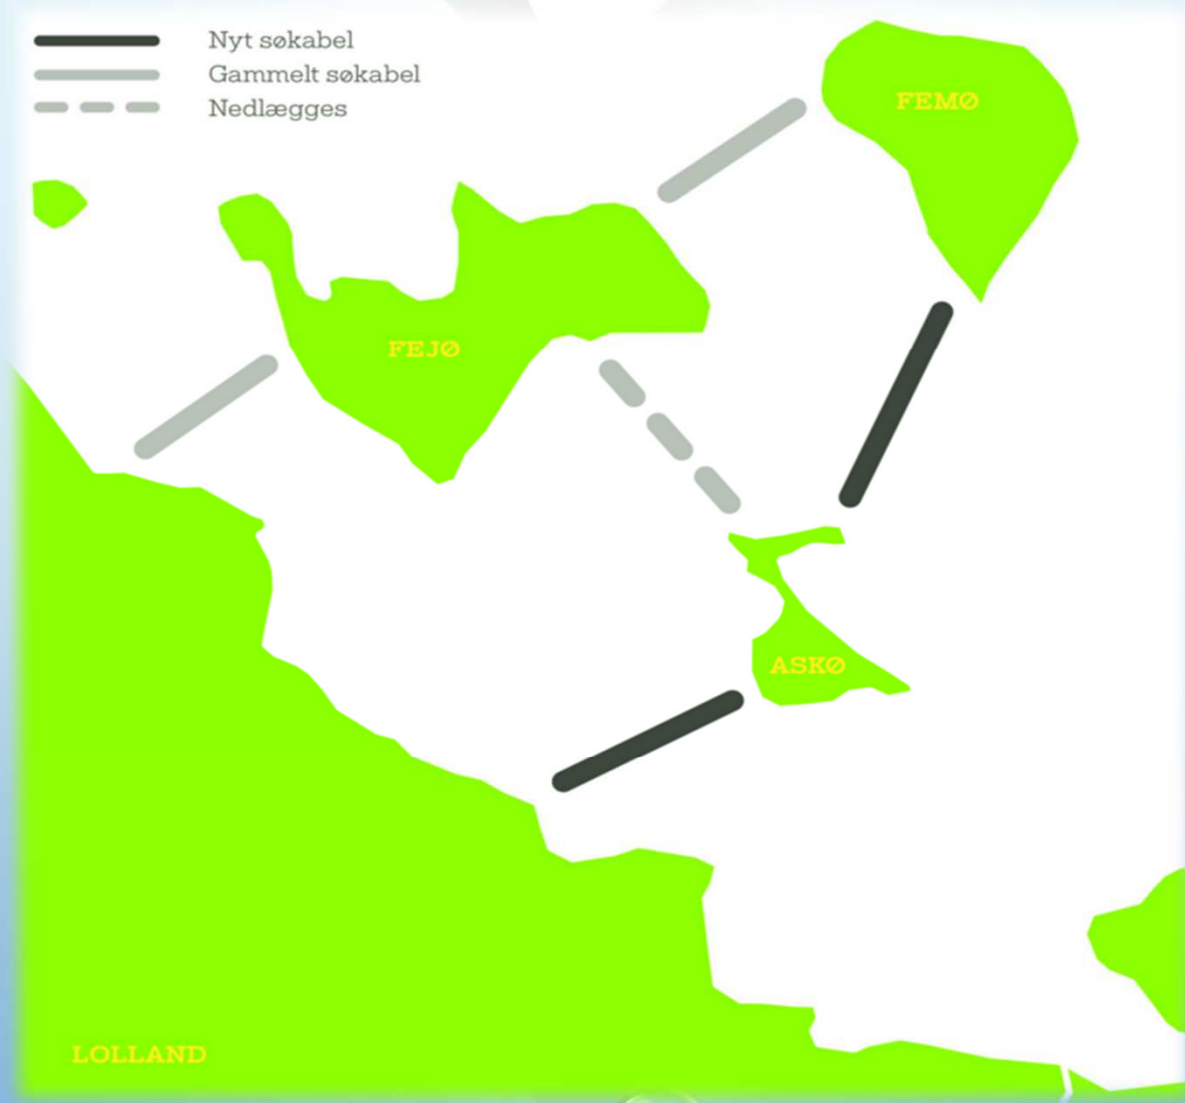

På Forkant – Ikke Udkant

GODE ERFARINGER

1. Opbakningen

- Lokalpolitikere > SEAS NVE (FIBIA)
- "Askø-boere" > Forhåndstilmeldinger (min 134)

2. Lokale ambassadører

- Fastboende > stemme dørklokker
- Foreninger > opslag – sociale medier

3. Tilgængelige ressourcer

- Fundraising > Landdistriktspuljen (MBBL)
- Vandværket afgiver plads til "krydsfelt"



På Forkant – Ikke Udkant



På Forkant – Ikke Udkant

UDFORDRINGER

1. Accept af finansiering (MBBL)

- Afhængig af minimum-tilmeldinger (ca. 50%)
- Manglende vision/accept ved den enkelte

2. Kommunikation

- Overgang fra SEAS NVE til FIBIA
- FIBIA >< Entreprenør >< Kunde
- Manglende "single point of contact"
- Korrekt faktureringsadresse

UDFORDRINGER

3. Reetablering af området

- Ikke selv valgt entreprenør
- Manglende dokumentation af områdets tilstand før og efter
- Vær opmærksom på anden infrastruktur

4. Andre udfordringer for tidsplan

- Arkæologi (stammebåd)
- Årstid (våd vinter)
- Manglende forundersøgelser

OPSUMMERING

- 1. Grib "golden moment"**
- 2. Få tidligt tilsagn om finansiering**
- 3. Sørg for opbakning lokalt**
- 4. Træk på netværket (gerne politisk)**
- 5. Fortæl den gode historie – VISION**
- 6. Vær opmærksom på anden infrastruktur**
- 7. Brug styret underboring, hvor det er muligt**

På Forkant – Ikke Udkant

FIBERNET PÅ ASKØ / LILLEØ



På Forkant – Ikke Udkant
